LAMPIRAN

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start
1		**GEDUNG ASRAMA PUTRI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**	**0 days**	**Wed 09/12/15**
2		**Pekerjaan Persiapan**	**7 days**	**Wed 09/12/15**
3		Pembersihan lokasi	5 days	Wed 09/12/15
4		Pasang Bowplank	1 day	Thu 17/12/15
5		**Pekerjaan Tanah**	**11 days**	**Fri 18/12/15**
6		GalianTanah	5 days	Fri 18/12/15
7		Urugan Pondasi	1 day	Thu 31/12/15
8		lantai kerja	1 day	Fri 01/01/16
9		**Pekerjaan Pondasi**	0 days	Wed 09/12/15
10		**Tiang Straus**	**172 days**	**Wed 09/12/15**
11		Pengecoran Straus	53 days	Thu 31/12/15
12		Pile cap	0 days	Wed 09/12/15
13		Pengecoran Pile cap	5 days	Tue 15/03/16
14		Bekisting Pilecap	10 days	Fri 18/03/16
15		**Pekerjaan Beton Lantai 1**	**31 days**	**Tue 15/03/16**
16		**Pekerjaan Sloof 35x60**	**9 days**	**Tue 12/04/16**
17		Pengecoran Sloof	6 days	Fri 15/04/16
18		Pembesian untuk sloof	1 day	Tue 12/04/16
19		Bekisting untuk Sloof (2x pakai)	3 days	Tue 12/04/16
20		**Pekerjaan sloof 20X30**	**24 days**	**Tue 15/03/16**
21		Pengecoran sloof	2 days	Thu 14/04/16
22		Pembesian untuk sloof	1 day	Wed 13/04/16
23		Bekisting untuk Sloof (2x pakai)	1 day	Tue 15/03/16
24		**Pekerjaan Kolom 60x60 lantai 1**	**9 days**	**Thu 14/04/16**
25		Pengecoran Kolom	5 days	Wed 20/04/16
26		Pembesian untuk kolom	3 days	Thu 14/04/16
27		Bekisting untuk kolom (2x pakai)	1 day	Tue 19/04/16
28		**Pekerjaan Kolom 25x50 lantai 1**	**6 days**	**Thu 14/04/16**
29		Pengecoran Kolom	1 day	Thu 21/04/16
30		Pembesian untuk kolom	1 day	Thu 14/04/16
31		Bekisting untuk kolom (2x pakai)	1 day	Wed 20/04/16
32		**Pekerjaan plat lantai1**	**5 days**	**Tue 19/04/16**
33		Pengecoran plat lantai1	2 days	Fri 22/04/16
34		Pembesian untuk plat	2 days	Tue 19/04/16
35		Bekisting untuk plat (2x pakai)	1 day	Thu 21/04/16
36		**Pekerjaan Beton Lantai 2**	**24 days**	**Wed 27/04/16**
37		**Pekerjaan Kolom 60x60 lantai 2**	**10 days**	**Wed 27/04/16**
38		Pengecoran Kolom	5 days	Wed 04/05/16
39		Pembesian untuk kolom	2 days	Wed 27/04/16
40		Bekisting untuk kolom (2x pakai)	3 days	Fri 29/04/16
41		**Pekerjaan Kolom 25x50 lantai 2**	**11 days**	**Wed 27/04/16**
42		Pengecoran Kolom	1 day	Wed 11/05/16
43		Pembesian untuk kolom	1 day	Wed 27/04/16
44		Bekisting untuk kolom (2x pakai)	1 day	Wed 04/05/16
45		**Pekerjaan balok B1 20x40**	**2 days**	**Thu 12/05/16**
46		Pengecoran balok	1 day	Thu 12/05/16
47		Pembesian untuk balok	1 day	Fri 13/05/16
48		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Fri 13/05/16
49		**Pekerjaan balok B1 30x55**	**3 days**	**Thu 12/05/16**
50		Pengecoran balok	1 day	Thu 12/05/16
51		Pembesian untuk balok	1 day	Mon 16/05/16
52		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Mon 16/05/16
53		**Pekerjaan balok B1 30x55**	**3 days**	**Fri 13/05/16**

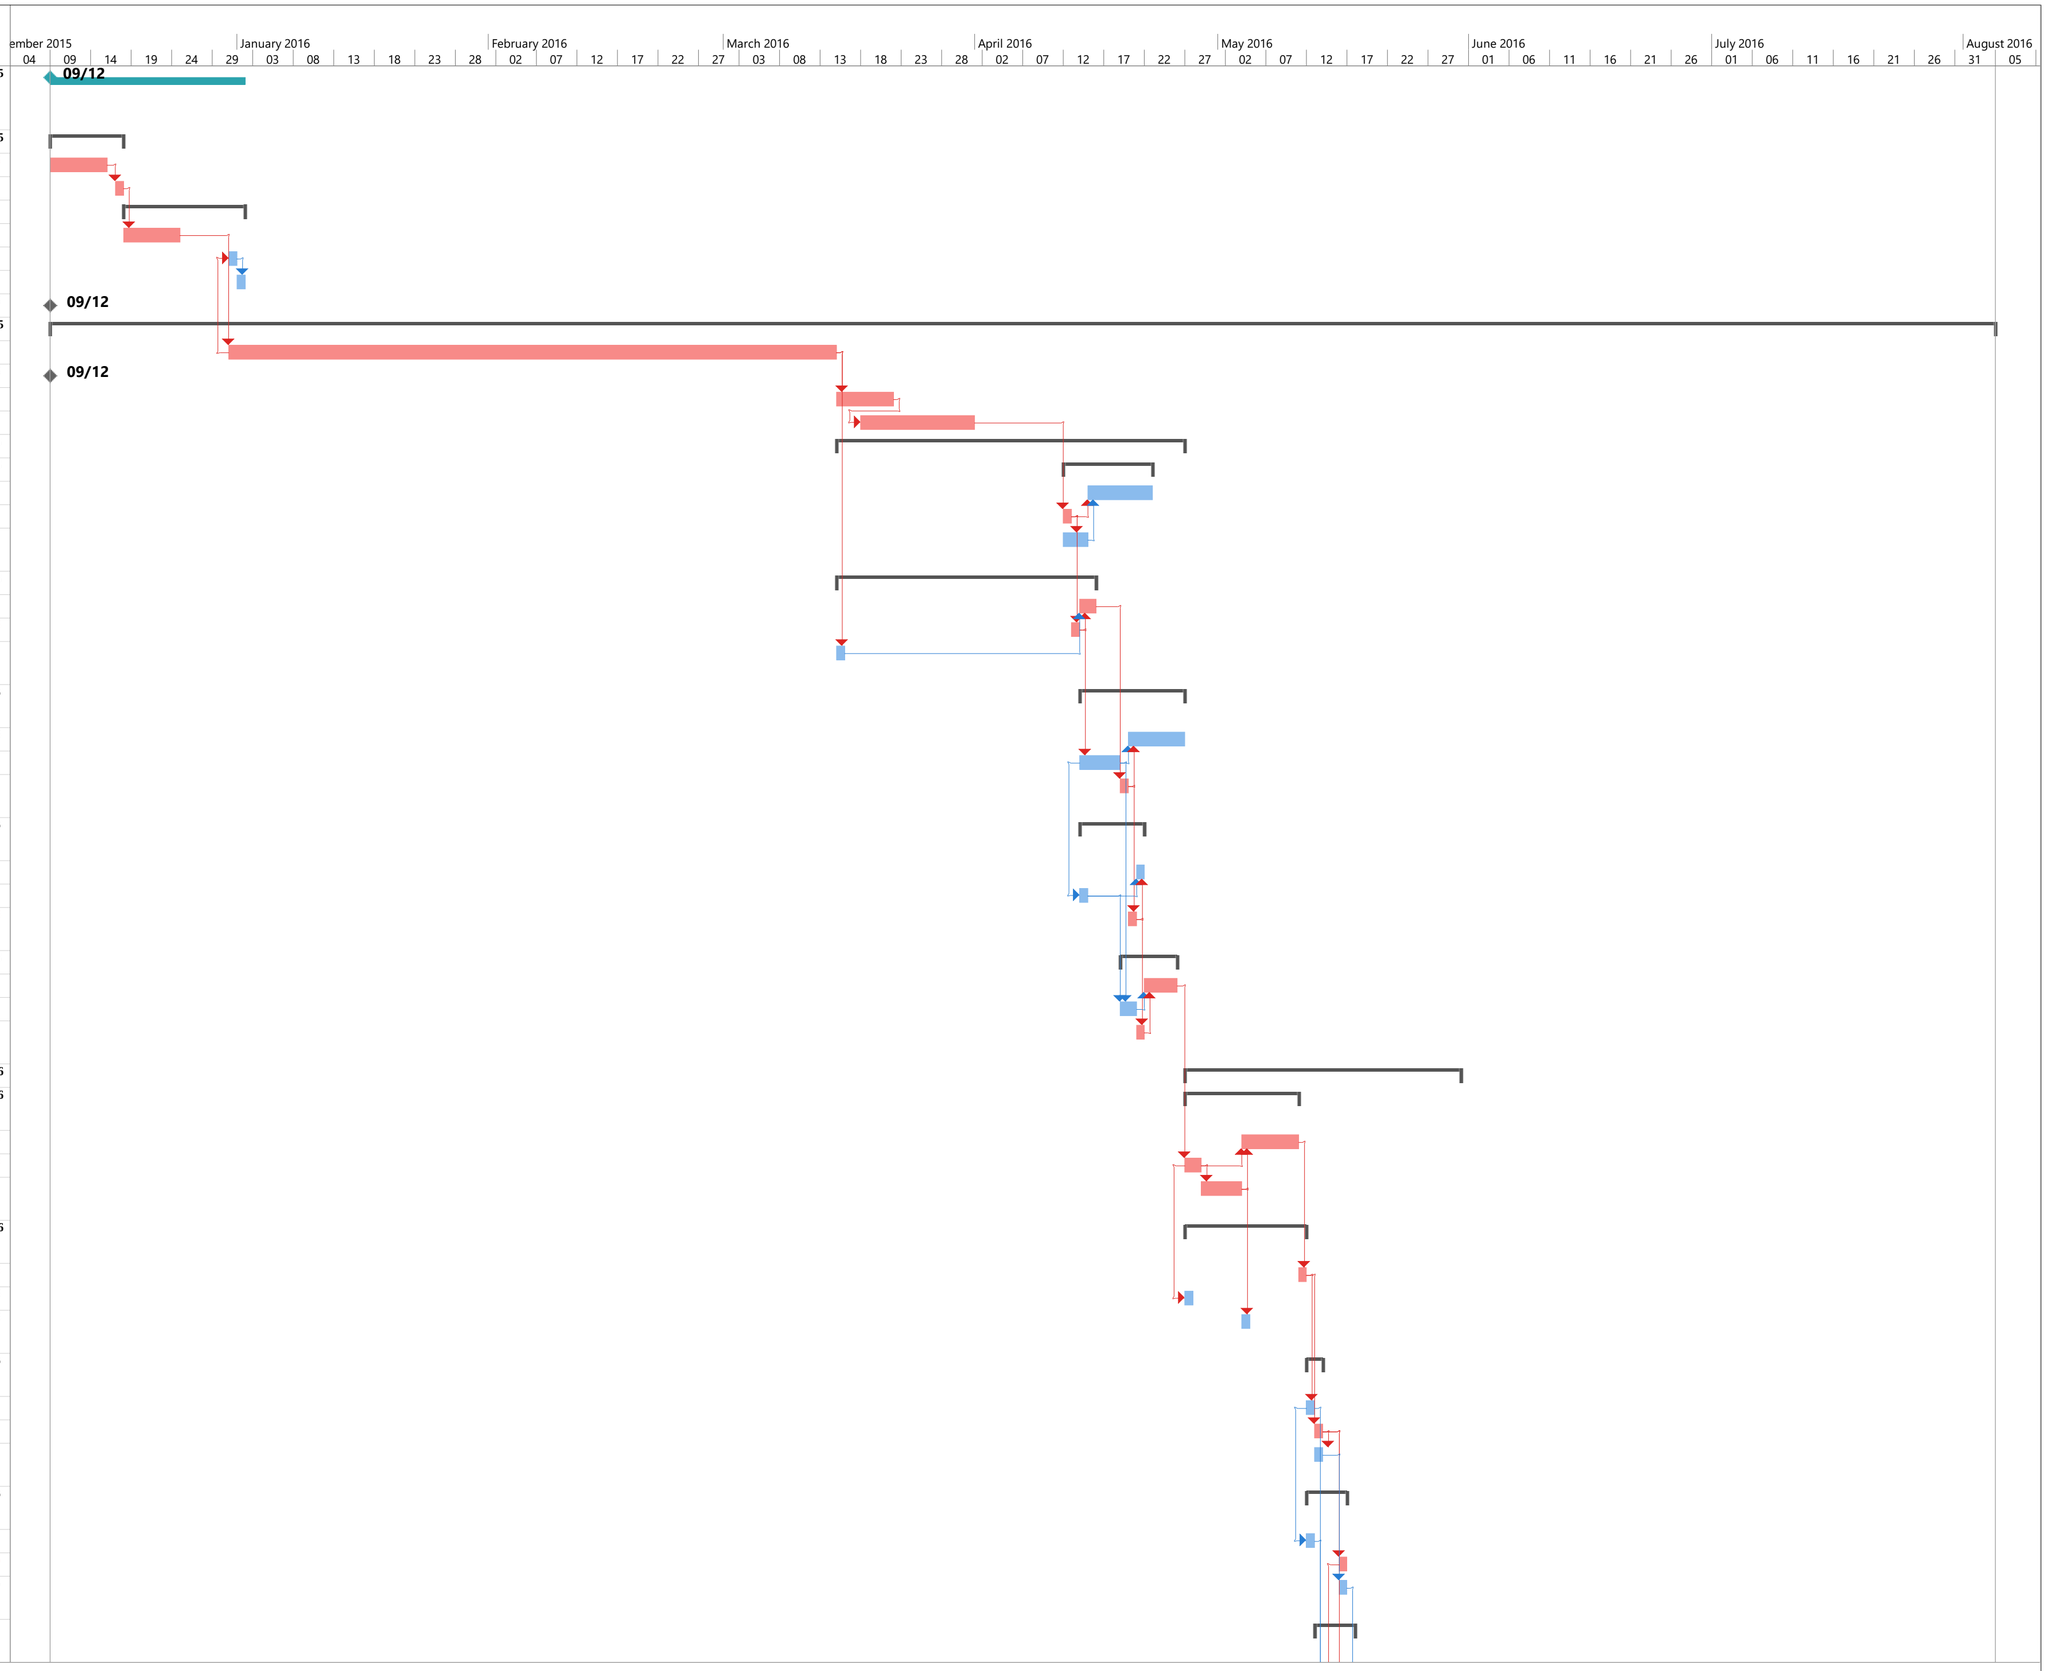

ID	Task Mo	Task Name	Duratio	Start
54		Pengecoran balok	2 days	Fri 13/05/16
55		Pembesian untuk balok	2 days	Mon 16/05/16
56		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Tue 17/05/16
57		**Pekerjaan balok B1 25x55**	**2 days**	**Wed 18/05/16**
58		Pengecoran balok	1 day	Thu 19/05/16
59		Pembesian untuk balok	1 day	Wed 18/05/16
60		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Wed 18/05/16
61		**Pekerjaan balok B2 25x50**	**2 days**	**Wed 18/05/16**
62		Pengecoran balok	1 day	Thu 19/05/16
63		Pembesian untuk balok	2 days	Wed 18/05/16
64		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Wed 18/05/16
65		**Pekerjaan balok B2 20X30**	**3 days**	**Wed 18/05/16**
66		Pengecoran balok	1 day	Thu 19/05/16
67		Pembesian untuk balok	1 day	Fri 20/05/16
68		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Wed 18/05/16
69		**Pekerjaan balok B2 15X30**	**3 days**	**Thu 19/05/16**
70		Pengecoran balok	1 day	Thu 19/05/16
71		Pembesian untuk balok	1 day	Mon 23/05/16
72		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Thu 19/05/16
73		**Pekerjaan balok B2 15X50**	**4 days**	**Thu 19/05/16**
74		Pengecoran balok	2 days	Thu 19/05/16
75		Pembesian untuk balok	1 day	Tue 24/05/16
76		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Fri 20/05/16
77		**Pekerjaan balok B3 25x50**	**3 days**	**Tue 24/05/16**
78		Pengecoran balok	2 days	Wed 25/05/16
79		Pembesian untuk balok	1 day	Tue 24/05/16
80		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Tue 24/05/16
81		**Pekerjaan balok B3 20X40**	**1 day**	**Wed 25/05/16**
82		Pengecoran balok	1 day	Wed 25/05/16
83		Pembesian untuk balok	1 day	Wed 25/05/16
84		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Wed 25/05/16
85		**Pekerjaan plat lantai 2**	**3 days**	**Thu 26/05/16**
86		Pengecoran plat	2 days	Fri 27/05/16
87		Pembesian untuk plat	1 day	Thu 26/05/16
88		Bekisting untuk plat (2x pakai)	1 day	Thu 26/05/16
89		**Pekerjaan Beton Lantai 3**	**19 days**	**Tue 31/05/16**
90		**Pekerjaan Kolom 60x60 lantai 3**	**9 days**	**Tue 31/05/16**
91		Pengecoran Kolom	5 days	Mon 06/06/16
92		Pembesian untuk kolom	2 days	Tue 31/05/16
93		Bekisting untuk kolom (2x pakai)	3 days	Wed 01/06/16
94		**Pekerjaan Kolom 25x50 lantai 3**	**3 days**	**Wed 01/06/16**
95		Pengecoran Kolom	1 day	Fri 03/06/16
96		Pembesian untuk kolom	1 day	Thu 02/06/16
97		Bekisting untuk kolom (2x pakai)	1 day	Wed 01/06/16
98		**Pekerjaan balok B1 20x40**	**3 days**	**Mon 13/06/16**
99		Pengecoran balok	1 day	Wed 15/06/16
100		Pembesian untuk balok	1 day	Tue 14/06/16
101		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Mon 13/06/16
102		**Pekerjaan balok B1 30x55**	**2 days**	**Tue 14/06/16**

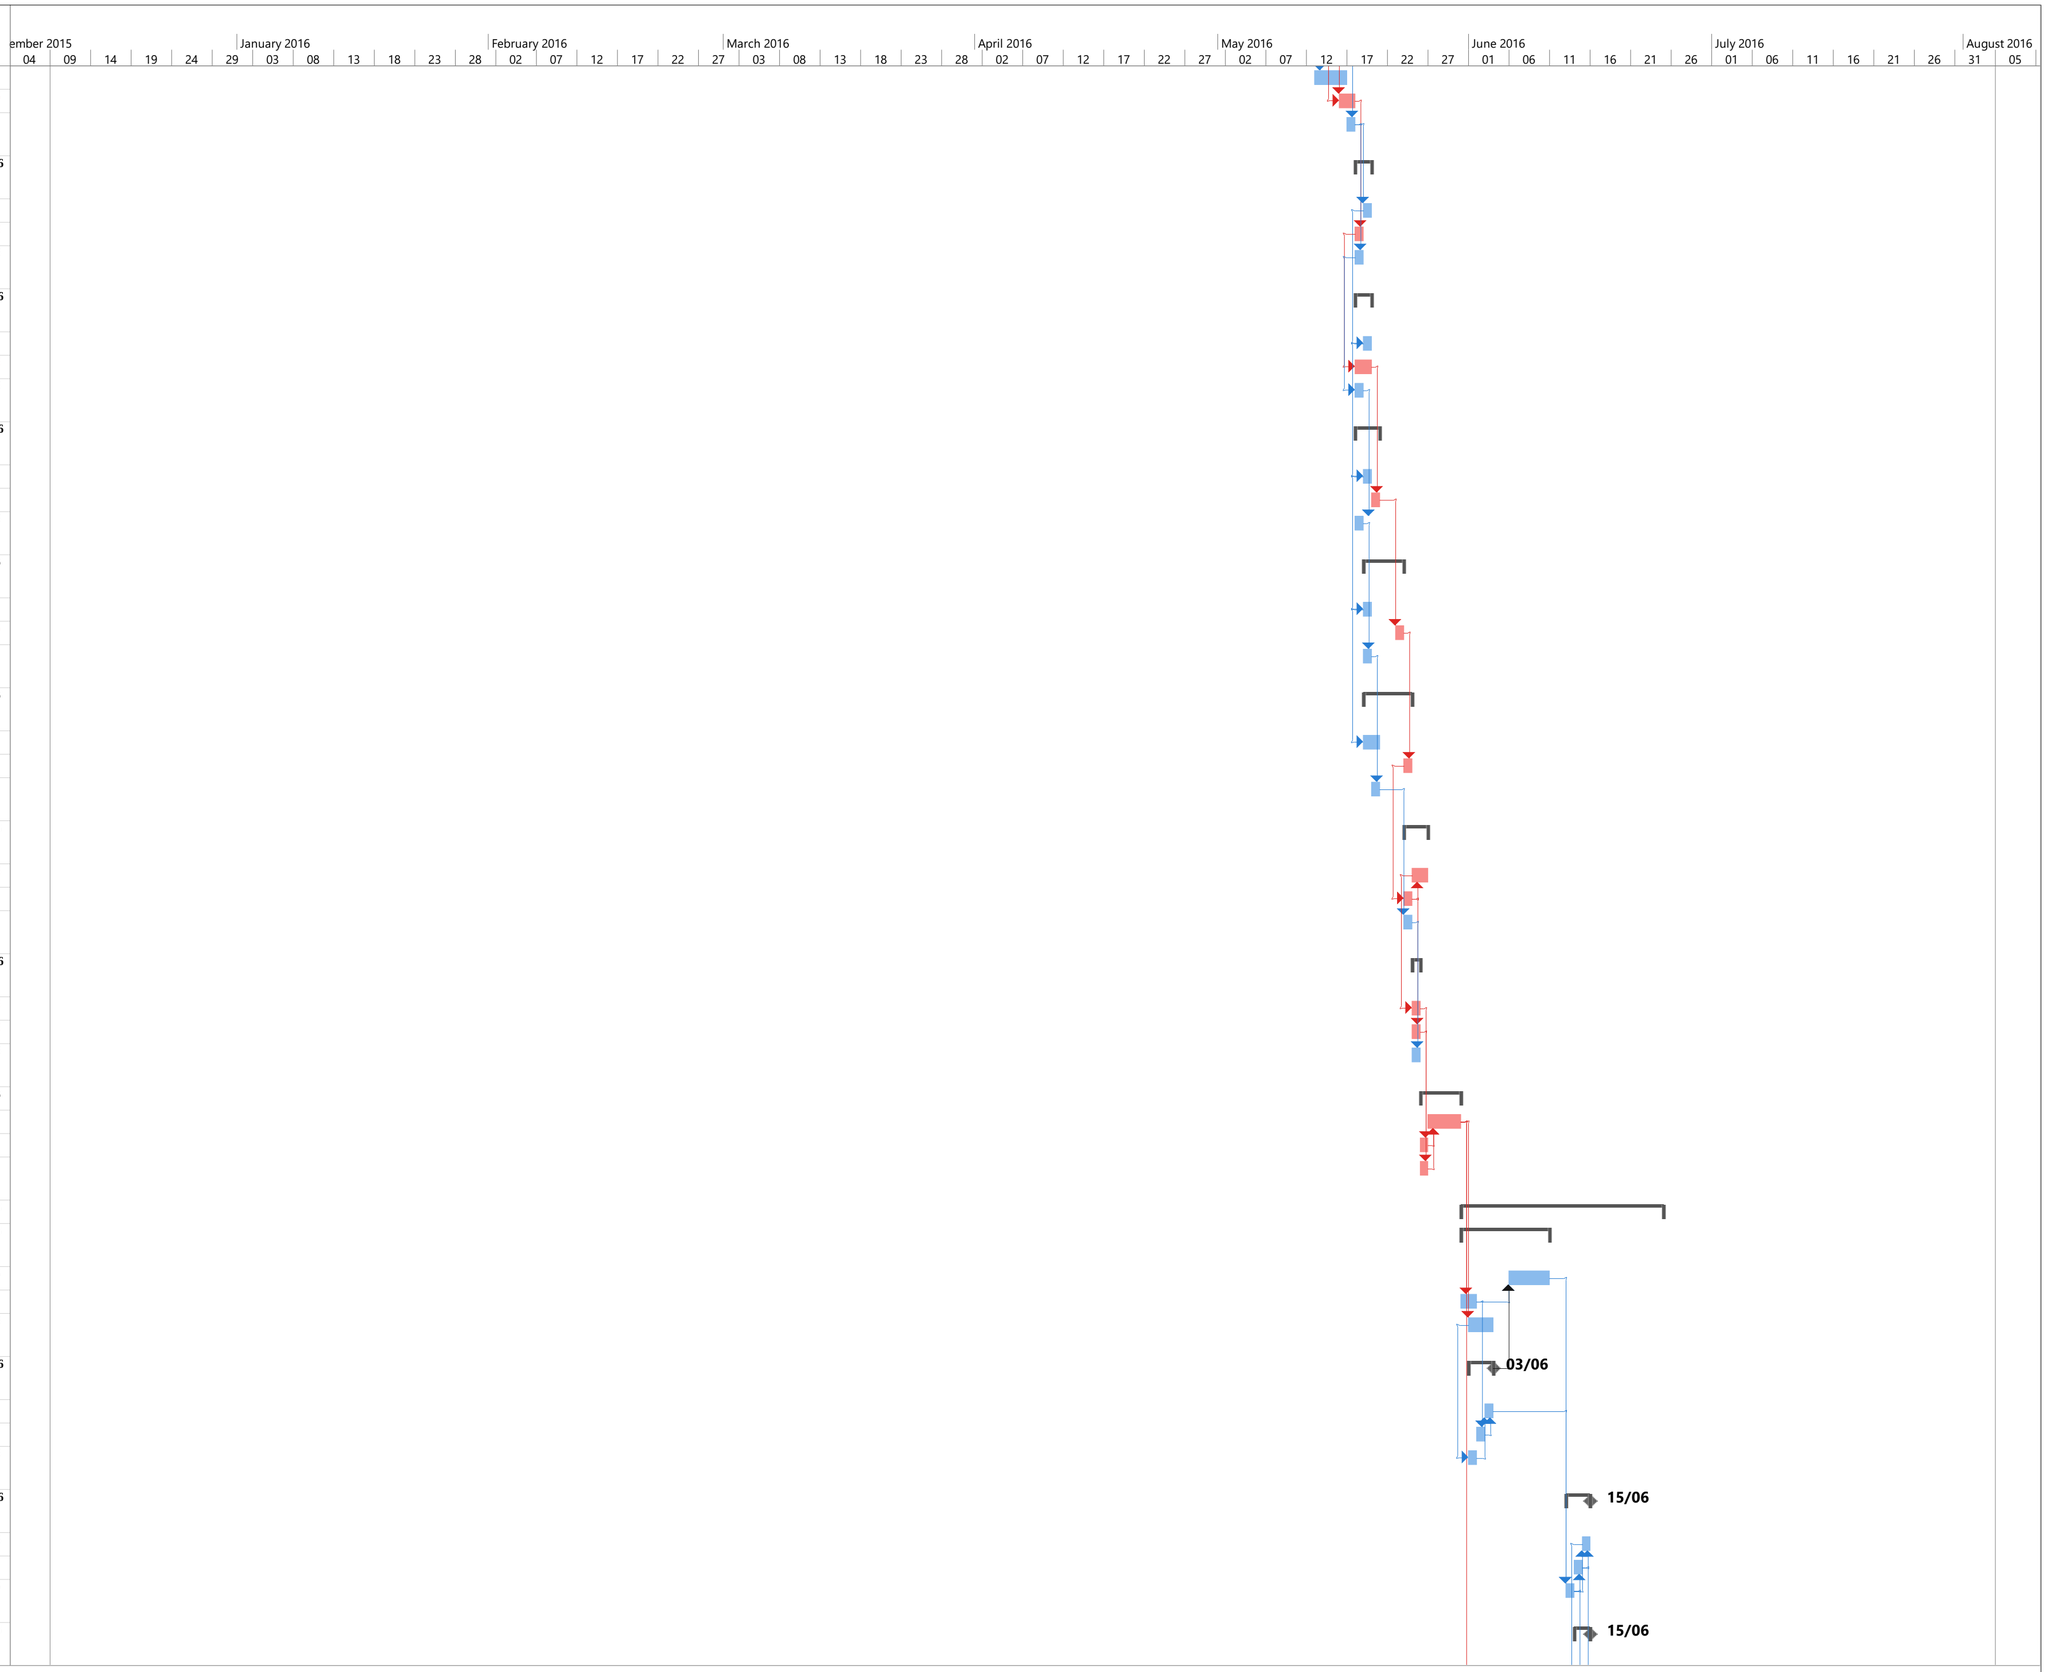
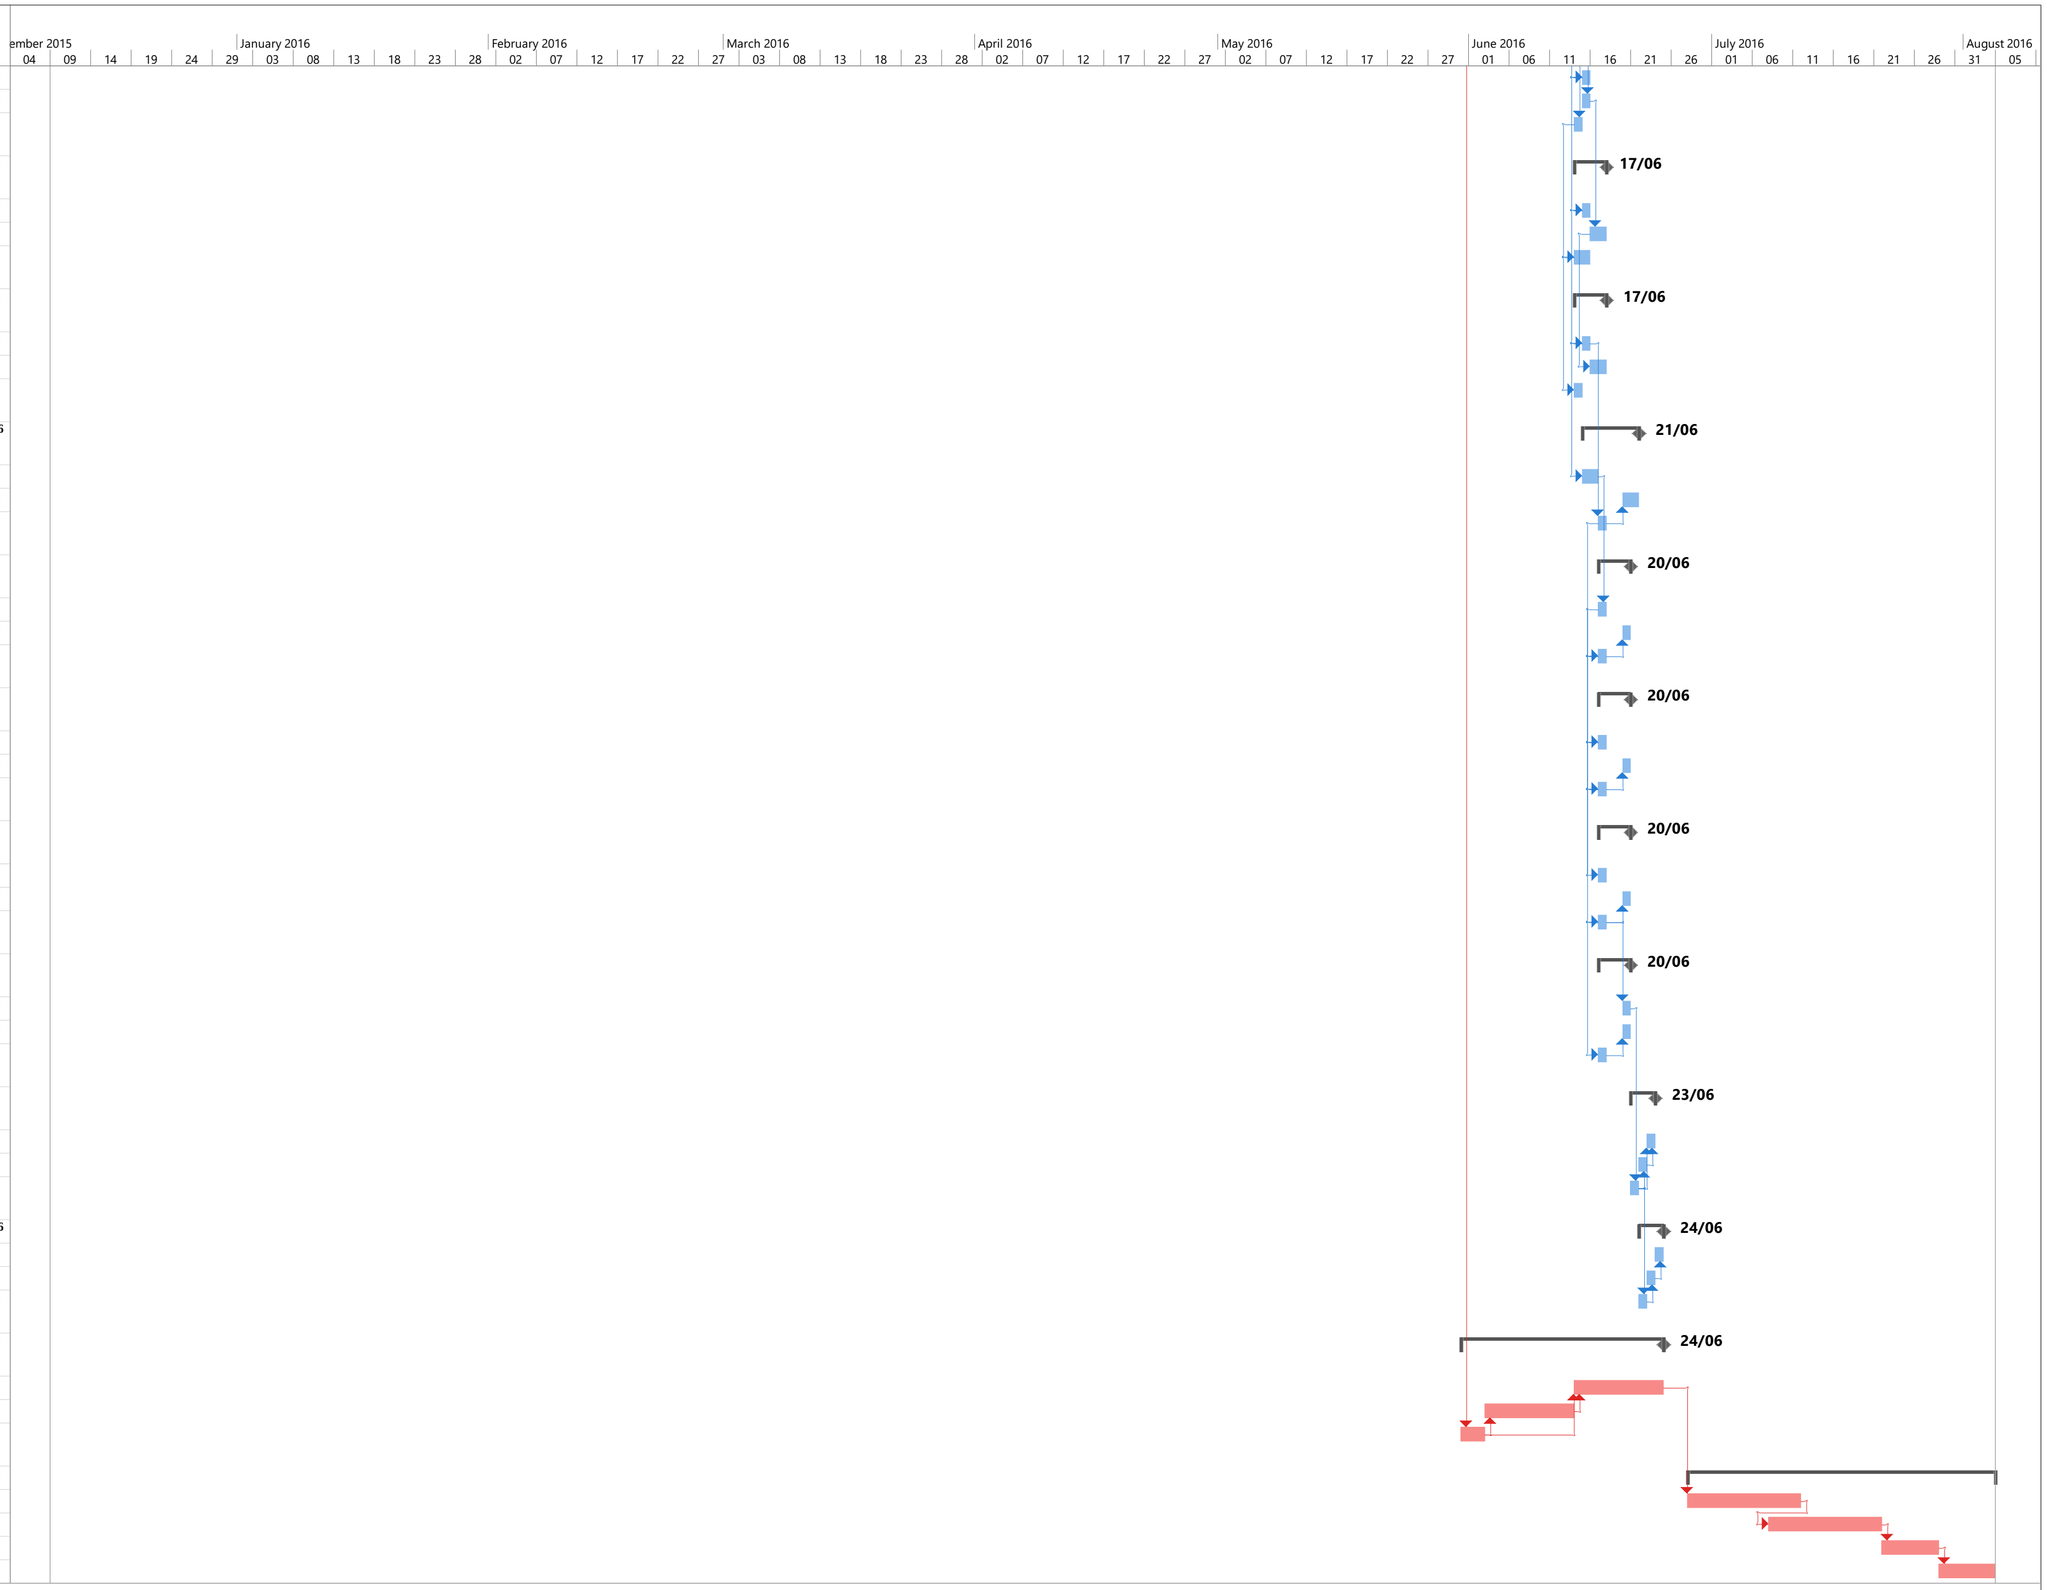
ID	Task Mo	Task Name	Duratio	Start
103		Pengecoran balok	1 day	Wed 15/06/16
104		Pembesian untuk balok	1 day	Wed 15/06/16
105		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Tue 14/06/16
106		**Pekerjaan balok B1 30x55**	**4 days**	**Tue 14/06/16**
107		Pengecoran balok	1 day	Wed 15/06/16
108		Pembesian untuk balok	2 days	Thu 16/06/16
109		Bekisting untuk balok (2x pakai)	2 days	Tue 14/06/16
110		**Pekerjaan balok B1 25x55**	**4 days**	**Tue 14/06/16**
111		Pengecoran balok	1 day	Wed 15/06/16
112		Pembesian untuk balok	2 days	Thu 16/06/16
113		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Tue 14/06/16
114		**Pekerjaan balok B2 25x50**	**5 days**	**Wed 15/06/16**
115		Pengecoran balok	2 days	Wed 15/06/16
116		Pembesian untuk balok	2 days	Mon 20/06/16
117		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Fri 17/06/16
118		**Pekerjaan balok B2 20X30**	**2 days**	**Fri 17/06/16**
119		Pengecoran balok	1 day	Fri 17/06/16
120		Pembesian untuk balok	1 day	Mon 20/06/16
121		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Fri 17/06/16
122		**Pekerjaan balok B2 15X30**	**2 days**	**Fri 17/06/16**
123		Pengecoran balok	1 day	Fri 17/06/16
124		Pembesian untuk balok	1 day	Mon 20/06/16
125		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Fri 17/06/16
126		**Pekerjaan balok B2 15X50**	**2 days**	**Fri 17/06/16**
127		Pengecoran balok	1 day	Fri 17/06/16
128		Pembesian untuk balok	1 day	Mon 20/06/16
129		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Fri 17/06/16
130		**Pekerjaan balok B3 25x50**	**2 days**	**Fri 17/06/16**
131		Pengecoran balok	1 day	Mon 20/06/16
132		Pembesian untuk balok	1 day	Mon 20/06/16
133		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Fri 17/06/16
134		**Pekerjaan balok B3 20X40**	**3 days**	**Tue 21/06/16**
135		Pengecoran balok	1 day	Thu 23/06/16
136		Pembesian untuk balok	1 day	Wed 22/06/16
137		Bekisting untuk balok (2x pakai)	1 day	Tue 21/06/16
138		**Pekerjaan plat lantai 3**	**3 days**	**Wed 22/06/16**
139		Pengecorann plat	1 day	Fri 24/06/16
140		Pembesian untuk plat	1 day	Thu 23/06/16
141		Bekisting untuk plat (2x pakai)	1 day	Wed 22/06/16
142		**Pekerjaan tangga Lantai 1&2**	**19 days**	**Tue 31/05/16**
143		Pengecoran tangga	9 days	Tue 14/06/16
144		Pembesian untuk tangga	7 days	Fri 03/06/16
145		Bekisting untuk plat (2x pakai)	3 days	Tue 31/05/16
146		**Pekerjaan Atap**	**28 days**	**Tue 28/06/16**
147		Pekerjaan Kuda-kuda	10 days	Tue 28/06/16
148		Pekerjaan gording	10 days	Fri 08/07/16
149		PekerjaanNok	5 days	Fri 22/07/16
150		pekerjaan penutup atap	5 days	Fri 29/07/16
